

Cyber Security Communication


Projektkommunikation

V1.3

Informatik

FH Zentralschweiz

Peter Sollberger

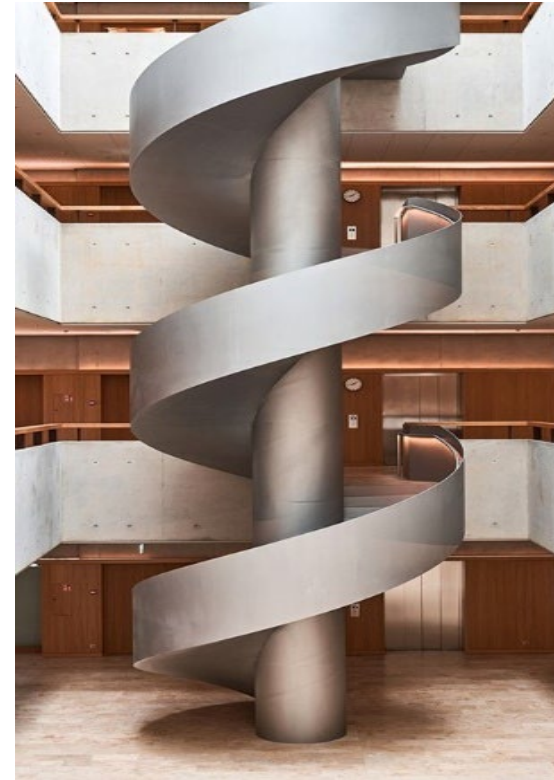

Pro Memoria: Projekt

- «Projekte sind in sich abgegrenzte, komplexe und/oder komplizierte Aufträge, deren Erfüllung eine Organisation bedingt, die für die Umsetzung der Tätigkeiten eine Projektmethode anwendet, mit der alle anfallenden Arbeiten geplant, gesteuert, durchgeführt und kontrolliert werden können.»

Quelle: Jenny, B. (2009): Projektmanagement – Das Wissen für eine erfolgreiche Karriere.

- «Ein zeit- und kostenbeschränktes Vorhaben zur Realisierung einer Menge definierter Ergebnisse entsprechend vereinbarter Qualitätsstandards und Anforderungen ...»

Quelle: Competence Baseline International Project Management Association [IPMA]

- «Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Unternehmen [Vorhaben], das unternommen wird, um ein einmaliges Produkt, eine Dienstleistung oder ein Ergebnis zu erzeugen.»

Quelle: Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute [PMI]

Inhalt

1. Einführung in die Projektkommunikation
2. Projektstandsitzung
3. Projektstatusbericht



Lernziele


- Sie kennen die Bedeutung und die wichtigsten Zielgruppen und Elemente der Kommunikation im Projekt.
- Sie können eine Projektstandsitzung gestalten.
- Sie wissen, wie Sie Projektstatusberichte gestalten und beurteilen.

1. Einführung in die Projektkommunikation



Pro Memoria: IT Product / Service Life Cycle


Bedeutung der Begriffe Ziele, Resultate und Anforderungen

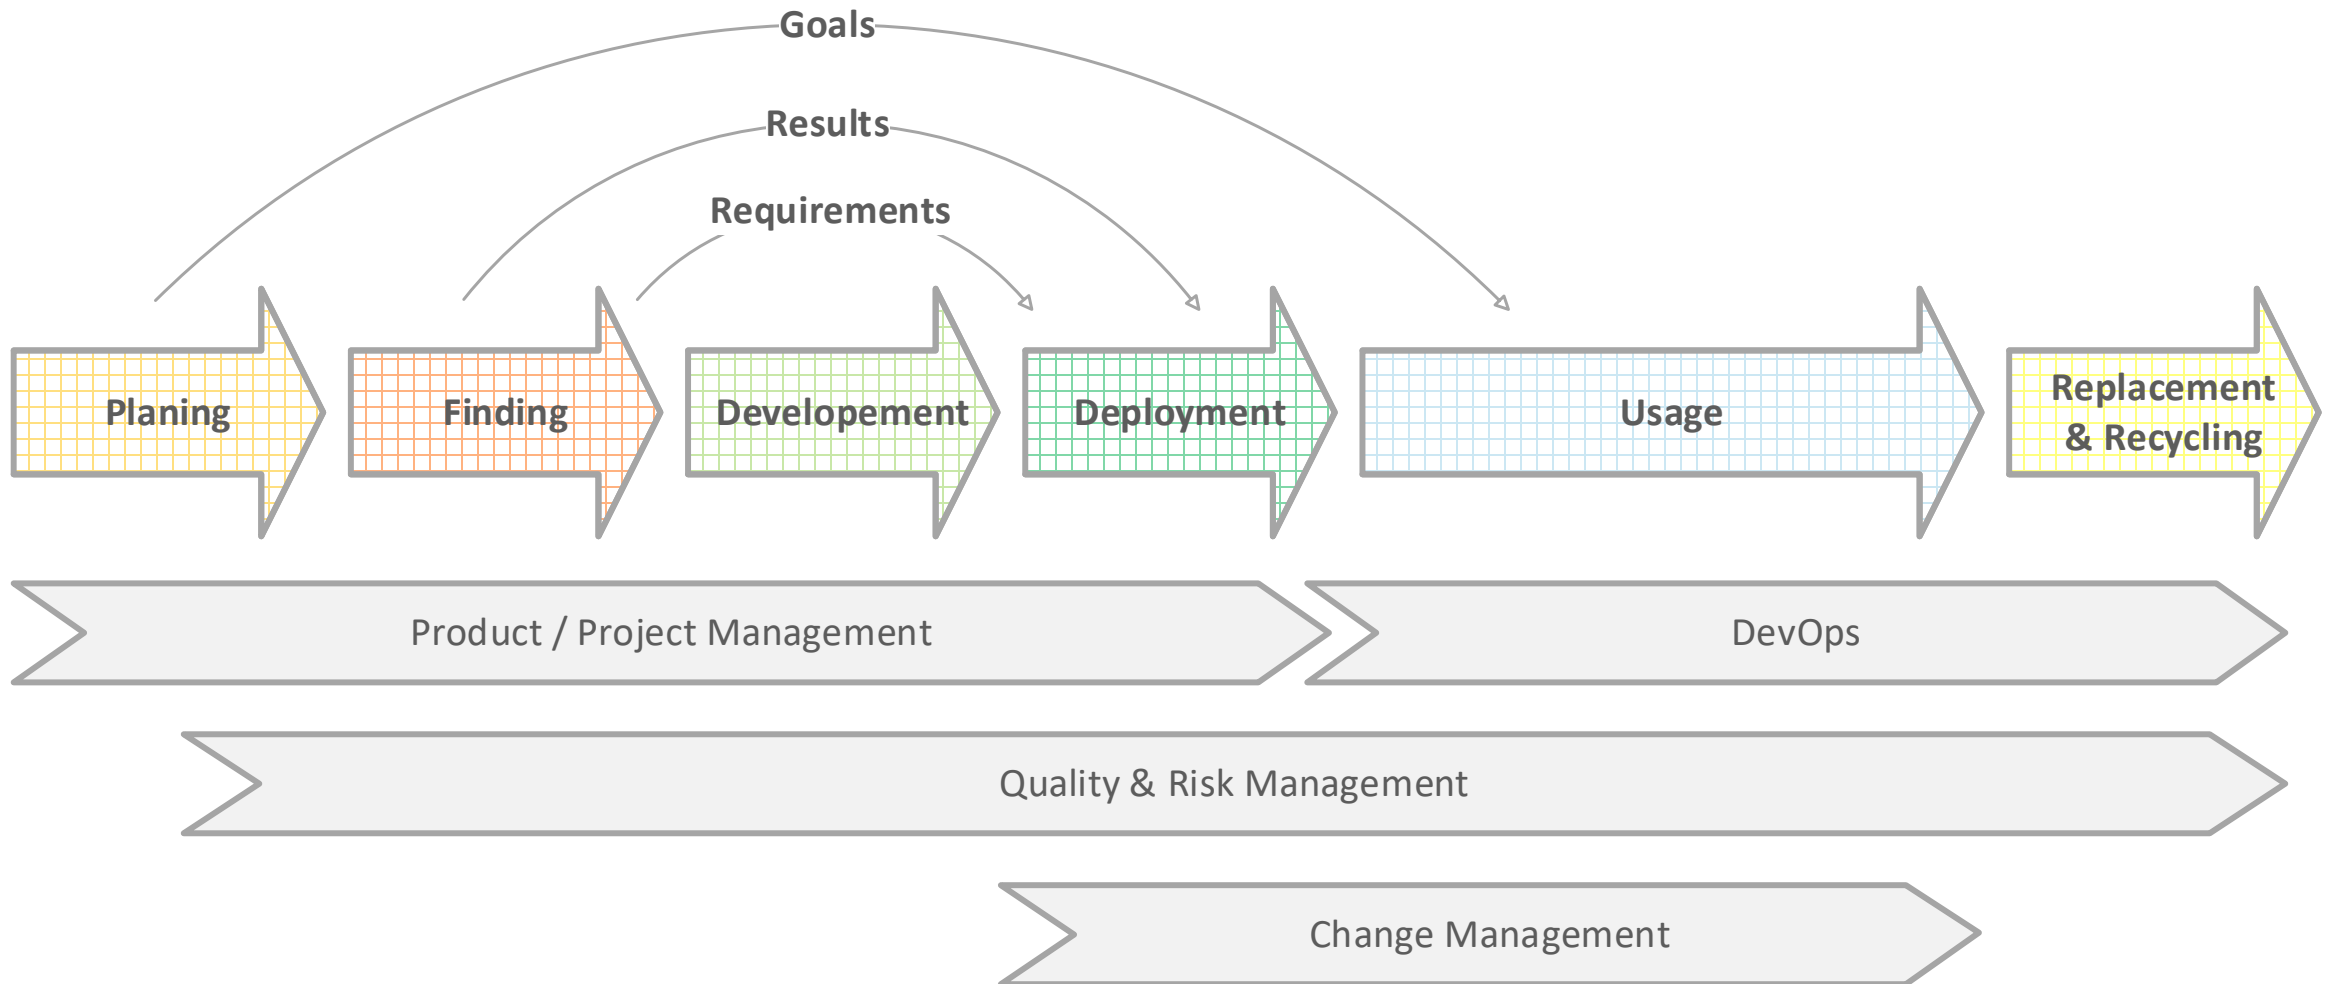

Pro Memoria: Projektdurchführung – klassisch versus agil

Beim **klassischen** Vorgehen wird der Leistungsumfang vereinbart und versucht, diesen innerhalb der geschätzten Zeit und mit dem geschätzten Aufwand zu realisieren. Dazu wird erst alles entworfen und dann alles realisiert.

→ *plan driven*

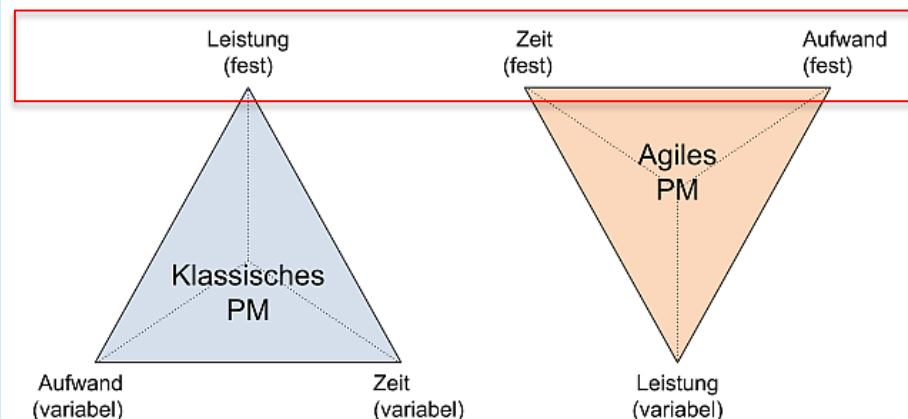

Beim **agilen** Vorgehen werden für eine vereinbarte Zeit mit gegebenem Aufwand möglichst viele Anforderungen umgesetzt. Dank iterativem Arbeiten steht jederzeit ein release-fähiges Inkrement zur Verfügung.

→ *value driven*

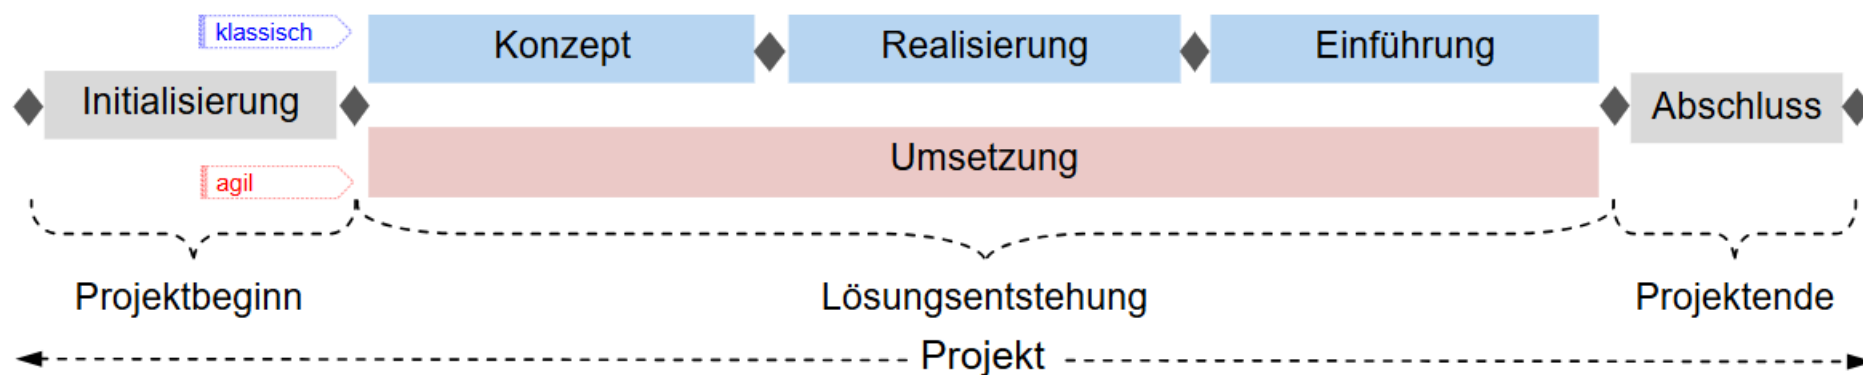



Abbildung 5: HERMES-Projektlebenszyklus mit Phasenmodell für klassische und agile Vorgehensweise

Aufgabe A – Anspruchs- und Zielgruppen

Welches sind aus Ihrer Sicht, die wichtigsten Anspruchs- und Zielgruppen im Umfeld eines Projektes?


Diskutieren Sie in Gruppen und machen Sie Notizen!

Zeit: 10 Minuten

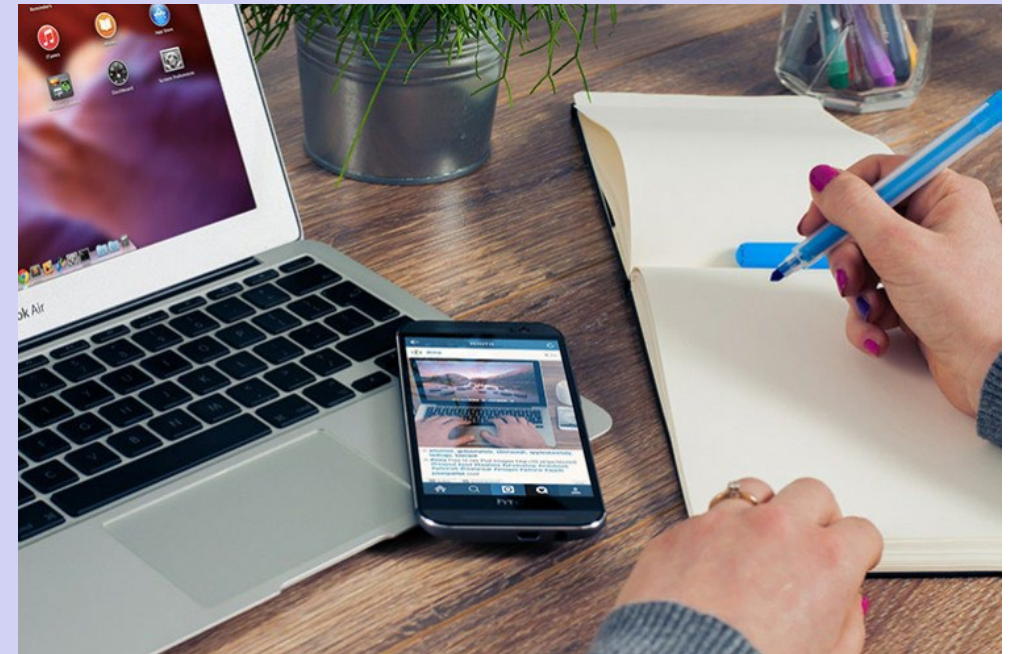

Lösung Aufgabe A

Funktionsstrukturierte Unterteilung der Projektorganisation

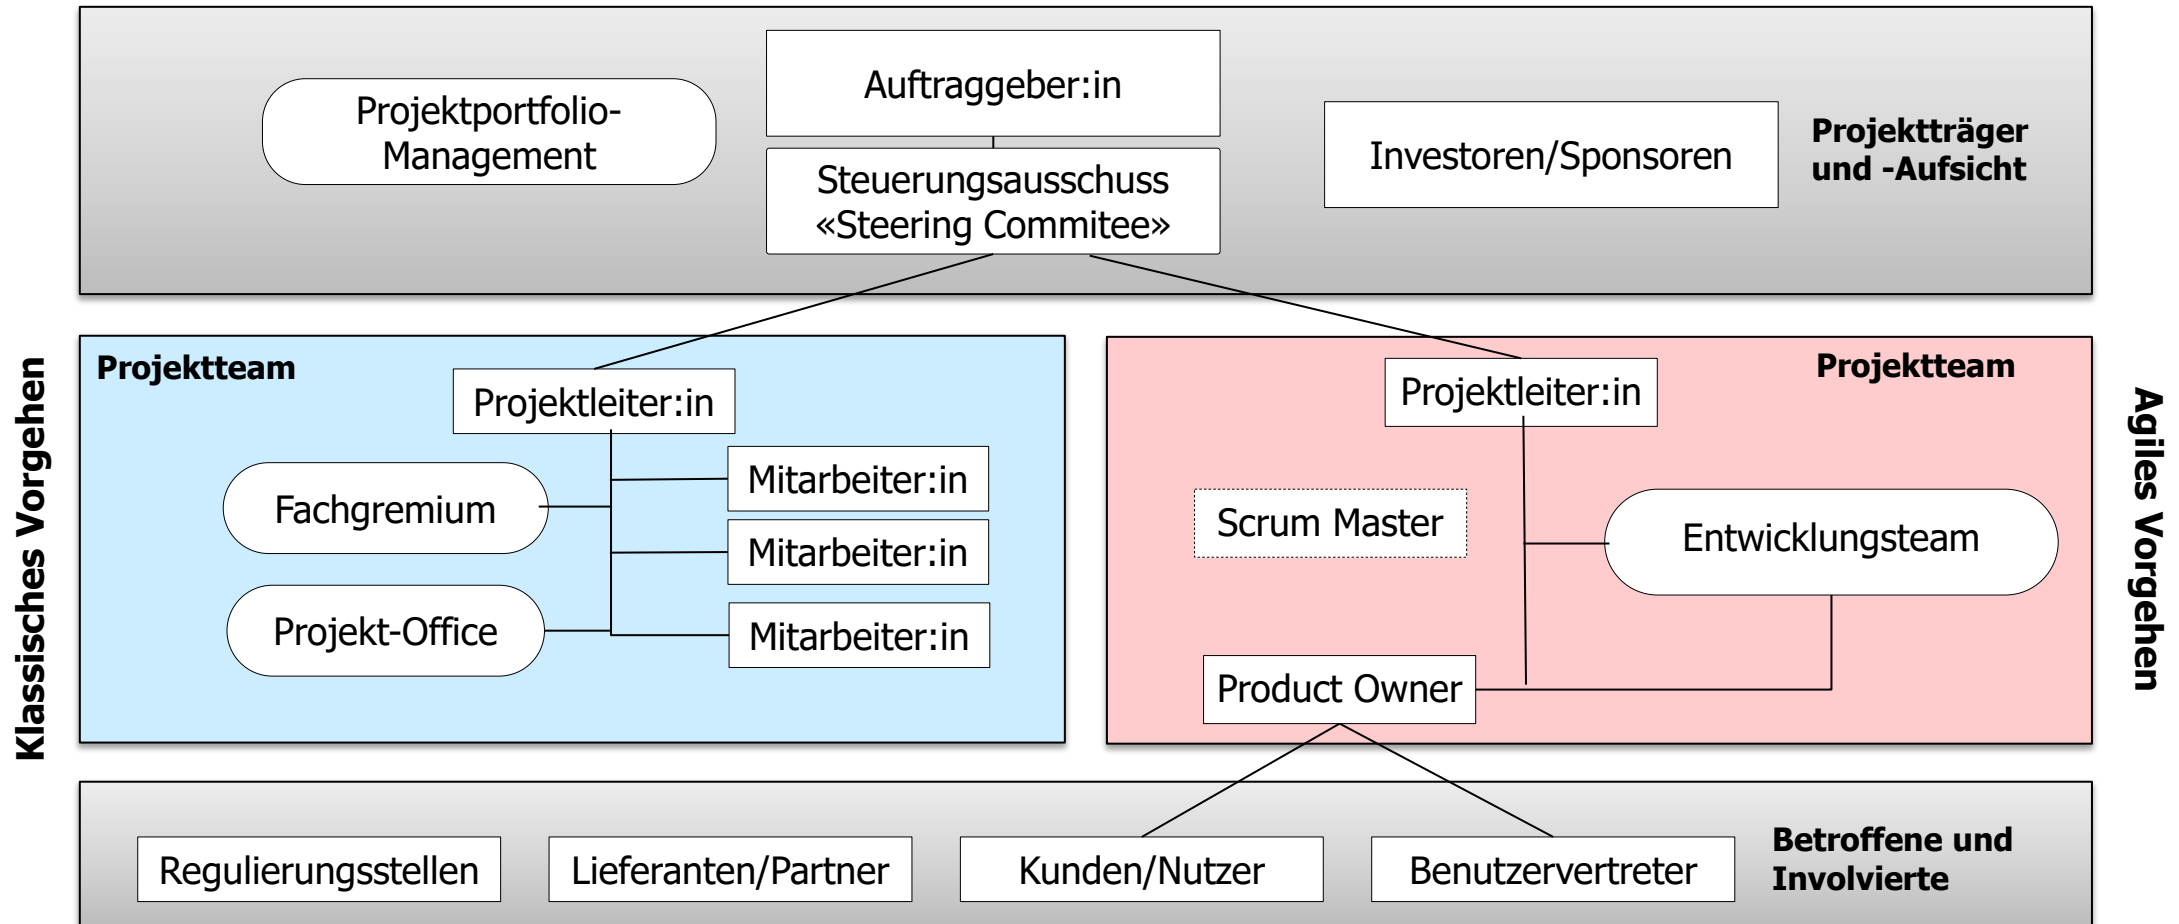

In Anlehnung an «Projektmanagement – Das Wissen für den Profi; Bruno Jenny, vdf Verlag»

Die wichtigsten Anspruchs- und Zielgruppen (I)

- Projektportfolio-Management
 - Finden, auswählen und priorisieren von Projekten zum Erreichen der Unternehmensziele.
- Auftraggeber:in
 - Formuliert den Projektauftrag.
 - Erstellt Wirtschaftlichkeitsberechnungen und definiert die Systemziele.
- Projektsteuerungsausschuss
 - Nimmt zusammen mit dem Auftraggeber:in die Zwischen- und Endergebnisse ab (Meilenstein «go/no-go» Entscheide).
- Projektteam
 - Umfasst alle Personen, die aktiv an der Umsetzung des Projekts arbeiten (z. B. Entwickler, Designer, Analysten).
 - verantwortlich für die Durchführung und Lieferung von Projektergebnissen

Die wichtigsten Anspruchs- und Zielgruppen (II)


- Kunden/Nutzer
 - Zielgruppe, die von den Projektergebnissen profitiert.
 - Erwartet ein qualitativ hochwertiges Produkt oder eine Dienstleistung.
- Lieferanten/Partner
 - Bereitstellung von Materialien, Technologien oder Dienstleistungen
 - abhängig von klaren Anforderungen, Terminen und vertraglichen Vereinbarungen
- Regulierungsstellen
 - Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. Datenschutz, Umweltauflagen)
 - Notwendig für Genehmigungen und Zertifizierungen

Aufgabe B - Instrumente der Projektkommunikation

Welches sind aus Ihrer Sicht, die wichtigsten Instrumente / Mechanismen, welche einer Projektleiterin resp. einem Projektleiter zur Verfügung stehen?

Diskutieren Sie in Gruppen und machen Sie Notizen!

Zeit: 10 Minuten

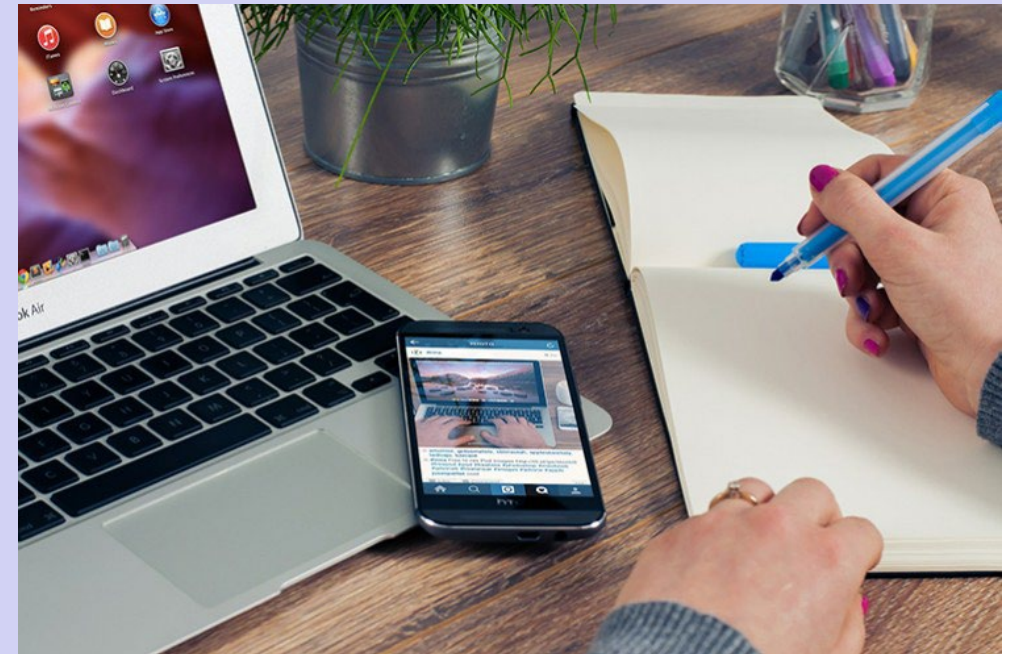

Lösung Aufgabe B

Instrumente der Projektkommunikation: Intern

- Projektplanung
 - Resultate, Meilensteine, Risiken
 - klassisch: Anforderungen, Arbeitspakete, Aufwände
 - agil: priorisierter Product-Backlog, Releaseplan
- **Projektstandsitzung** (Koordination, Abstimmung)
- Reviews
 - formelle, systematische Prüfung eines [Teil-] Resultats
- Audits
 - Überprüfung oder Bewertung von Prozessen, Systemen oder Organisationen, um festzustellen, ob bestimmte Standards, Richtlinien oder gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.
- regelmässige Einzelgespräche (Jour Fixe)

Instrumente der Projektkommunikation: Extern

- **Projektstatusberichte** (zielgruppengerecht)
 - regelmässige Updates zu Fortschritt, Meilensteinen, Risiken und nächsten Schritten
- Risikoberichte
 - potenzielle Risiken in einem Projekt, deren Auswirkungen, sowie Massnahmen zur Minimierung oder Bewältigung dieser Risiken
- Projekt-Marketing
 - Fachartikel, wissenschaftliche Publikationen, Konferenzbeiträge, Pressemitteilungen
- Weitere Stakeholder-Management Aktivitäten
 - Präsentationen
 - News-Letter
 - Workshops und Schulungen

2. Projektstandsitzung



Projektstandsitzung / erweitertes «Daily Scrum»


- Im klassischen Projektmanagement ist die Projektstandsitzung das wichtigste Führungsinstrument innerhalb des Projekts für die Projekt- oder Teilprojektleiter:in.
- Im agilen Projektvorgehen gibt es das «Daily Scrum», welches einen Teil einer Projektstandsitzung (Projektstatus) abdeckt.
- Es empfiehlt sich aber regelmässig als Erweiterung zum «Daily Scrum» eine eigentliche Projektstandsitzung durchzuführen, in welchem dann zusätzliche Themen wie Personelles, Fachthemen und Risiken behandelt werden können.

Rekurs: Aufgabe C – Effiziente Sitzungen

Was ist notwendig, damit eine Sitzung effizient durchgeführt werden kann und für das Projekt und alle Beteiligten einen Mehrwert bringt?

Diskutieren Sie in Gruppen und machen Sie Notizen!

Zeit: 10 Minuten

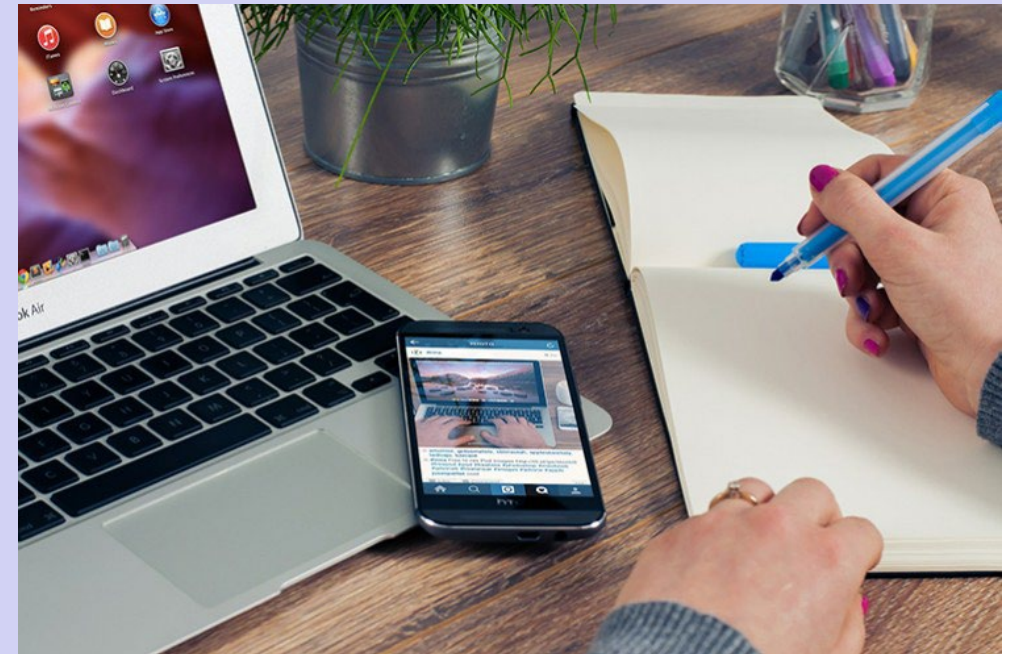

Lösung Aufgabe C

Effiziente Sitzungen - Vorbereitung

- Ziele definieren:
Was soll am Ende der Sitzung erreicht sein? (z. B. Entscheidungen, Lösungen, nächste Schritte)
- Teilnehmerkreis festlegen:
Lade nur Personen ein, die direkt beitragen oder betroffen sind.
- Agenda erstellen:
Strukturierte Themenliste mit Zeitvorgaben für jedes Thema.
- Materialien vorbereiten:
Relevante Unterlagen rechtzeitig verteilen, damit sich alle vorbereiten können.

Tipp: Sende die Agenda mindestens 24 Stunden vor der Sitzung.

Effiziente Sitzungen - Durchführung

- Pünktlich beginnen und enden:
Respektiere die Zeit aller Beteiligten.
- Moderation übernehmen:
Leite die Sitzung aktiv – achte auf Fokus und Zeitmanagement.
- Zielorientierte Diskussionen:
Bleibe bei den Themen der Agenda, vermeide Abschweifungen.
- Ergebnisse festhalten:
Beschlüsse, offene Fragen und Aufgaben schriftlich dokumentieren.

Tipp: Nutze eine Timebox-Methode (z. B. 15 Minuten pro Thema), um Zeitrahmen einzuhalten.

Effiziente Sitzungen - Nachbereitung

- Protokoll versenden:
Kurz und präzise – Was wurde entschieden?
Wer macht was bis wann?
- Ergebnisse nachverfolgen:
Verantwortung klären und nächste Schritte kontrollieren.

Tipp: Halte offene Punkte für die nächste Sitzung fest, um Fortschritt zu sichern.

Zweck Projektstandsitzung / erweitertes «Daily Scrum»

- Sie garantiert einen regelmässigen Informationsfluss innerhalb des Projekts zwischen den einzelnen Mitarbeitenden.
- Es ist das Reporting der Projekt-Mitarbeitenden oder Teilprojektleiter:in gegenüber dem Projektleiter:in.
- Sie übt bezüglich der Projektergebnisse einen gewissen «Druck» auf die Projekt-Mitarbeitenden aus.
- Sie bietet eine Plattform, um über Probleme zu sprechen, die Lösungsfindung zu initiieren und Entscheide zu fällen.

Form Projektstandsitzung / erweitertes «Daily Scrum»

- Agenda und Protokoll
 - Sitzung muss eine klare und fixe Agenda und Struktur haben.
 - Sitzungsprotokoll (Entscheidungsprotokoll) wird geführt.
- Periode
 - Sitzung soll wöchentlich oder zwei-wöchentlich stattfinden.
- Teilnehmer
 - Projektleiter:in
 - Alle Projektmitarbeiter:innen oder bei grossen Projekten die Teilprojektleiter:innen
- Dauer:
 - maximal 1½ - 2 Stunden

Aufgabe D – Agenda Projektstandsitzung / erweitertes «Daily Scrum»


Wie sieht die Agenda einer Projektstandsitzung aus?

Welche Inhalte sollen besprochen werden?

Entwerfen Sie eine Standardagenda für eine Projektstandsitzung!

- Welche Themen müssen an jeder Sitzung behandelt werden? Überlegen Sie aus der Sicht des Projektleiters respektive der Projektleiterin.
- Welche Informationen braucht er/sie?

Zeit: 10 Minuten

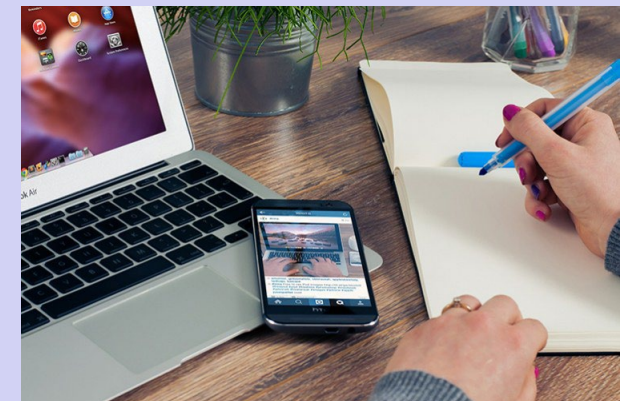

Lösung Aufgabe D

Agenda Projektstandsitzung / erweitertes «Daily Scrum»

Beispiel für ein grosses Projekt mit Linien-Projektorganisation
(Projektleiter:in ist während der Dauer des Projektes auch Linienvorgesetzter)

1. Begrüssung, Anwesenheit
2. Letztes Protokoll
3. Allgemeine Infos
4. Status & Querinfos der Teilprojekte
5. Pendenzen
6. Status der Issues
7. Risiken
8. Nächste Termine
9. Spezial und Fachthemen
10. Ferienliste/Abwesenheiten
11. Diverses

Inhalt Projektstandsitzung (I)

1. Begrüssung

- Teilnehmende und Entschuldigungen

2. Letztes Protokoll

- Formale Abnahme des Protokolls der letzten Projektstandsitzung
- Letzte Möglichkeit Entscheide zu beeinflussen oder «umzukehren»

[Beispiel eines Projektstandsitzungsprotokolls aus DiMA](#)

3. Allgemeine Infos

- Hier können durch den Projektleiter allgemeine Informationen kommuniziert werden, die nicht direkt die Resultate und Planung betreffen.
- z.B. organisatorische Veränderungen, Budgetpläne oder Informationen über die Firma generell

Inhalt Projektstandsitzung (II)

4. Status & Querinfos der Teilprojekte

- Hier präsentiert jedes Teilprojekt den Stand «seiner» (in seiner Verantwortung liegender) Projektergebnisse.
Aufgezeigt werden pro Resultat:
 - Namen des Resultats
 - Termin
 - Restaufwand
 - Status und Aussicht
 - Bemerkungen/Probleme
- Bei der Rapportierung in der Projektstandsitzung immer die gleiche Resultatstruktur (Hauptresultate/Teilresultate) verwenden, welche man zu Beginn erarbeitet hat.
- Nicht die Arbeitspakete rapportieren, nur Resultate!
- Auch die Projektleiterin / der Projektleiter präsentiert den Status des Gesamtprojektes

[Beispiel für Resultat-Rapportierung als Präsentationshilfsmittel](#)

Inhalt Projektstandsitzung (II)

5. Pendenzen

- Unter diesem Agendapunkt werden die laufenden Pendenzen aus der Projektstandsitzung behandelt.
- Pendenzen sind «kleinere» Aufträge an die Teilnehmenden der Projektstandsitzung, welche im Rahmen der Sitzung rapportiert werden.
- Achtung: **Pendenzen sind kein Ersatz für das reguläre Projektmanagement.**

6. Status der Issues

- Issues sind wichtige und ausgewählte Fragestellungen aus dem Projekt, welche für den Erfolg des Projekts zentral sind.
- Issues werden zwar im Rahmen der Konzeptarbeiten analysiert, bearbeitet, beantwortet und dokumentiert, sie sollen aber im Rahmen der Projektstandsitzung für alle Personen transparent und abschliessend beantwortet werden

[Beispiel Issue-Liste](#)

[Beispiele für Rapportierung einer Issue-Beantwortung](#)

Inhalt Projektstandsitzung (IV)

7. Status Risiken

- Ein Risiko ist ein Zustand oder Ereignis, welches den Projekterfolg gefährden kann und «ausserhalb» des normalen Projektmanagements bearbeitet und verfolgt werden muss.
- Die Veränderung der Projektrisiken und der Stand der Massnahmen soll in jeder Projektstandsitzung kurz besprochen werden.
- Für jedes Projektrisiko muss festgelegt werden:
 - Eintretenswahrscheinlichkeit
 - Auswirkung
 - getroffenen Massnahmen, um das Risiko abzuwehren
- Eine Faustregel ist, dass es pro Projekt maximal 4 bis 10 Projektrisiken gibt, die gemanaged werden müssen.
(Vielfach werden zu viele Risiken oder Risiken aufgeführt z.B. «zu wenig Ressourcen»), welche bereits über das normale Projektmanagement bearbeitet werden.)

Beispiel für Risikoliste

Inhalt Projektstandsitzung (V)

8. Nächste Termine

- Unter diesem Agendapunkt werden die wichtigsten Termine des Projekts für die nächsten 3 Monate kommuniziert und in Erinnerung gerufen.
(z.B. nächster Steuerungsausschuss oder nächster wichtiger Projektmeilenstein)

Beispiel für nächste Termine

9. Spezial- und Fachthemen

- Unter diesem Agendapunkt werden kurz vorgestellt und besprochen
 - Spezialthemen, z.B. die Aufbereitung der Projektplanung oder
 - Fachthemen, wie z.B. die Applikationsarchitektur
- Hinweis:
An der Sitzung kann nur kurz das Thema und das Konzept aufgezeigt werden, maximal 10 - 15 Minuten pro Thema.
Die Projektstandsitzung ist kein Workshop für die Bearbeitung und Lösung von Fachproblemen.

Inhalt Projektstandsitzung (VI)

10. Ferienliste / Abwesenheiten

- Unter diesem Agendapunkt werden die Abwesenheiten wichtiger Schlüsselpersonen im Projekt kommuniziert.

Beispiel Abwesenheiten

11. Diverses

- Hier können Themen aufgenommen werden, die sonst nirgends Platz haben (z.B. Büroregeln «Handygebrauch» etc.)
- Maximal 5 Minuten

Dauer Projektstandsitzung: **1½ bis maximal 2 Stunden**


Best Practice: Wenn ein Thema nicht abschliessend behandelt werden kann:

- Besprechung des Themas abbrechen und eine separate Sitzung oder Workshop vereinbaren.

4. Projektstatusbericht

*Bild: Bundesamt für Strassen ASTRA,
A2 Zweite Röhre Gotthard,
Projektstand 18.9.2025,*

<https://gotthardtunnel.ch/aktuelles/projektstand-webcam>

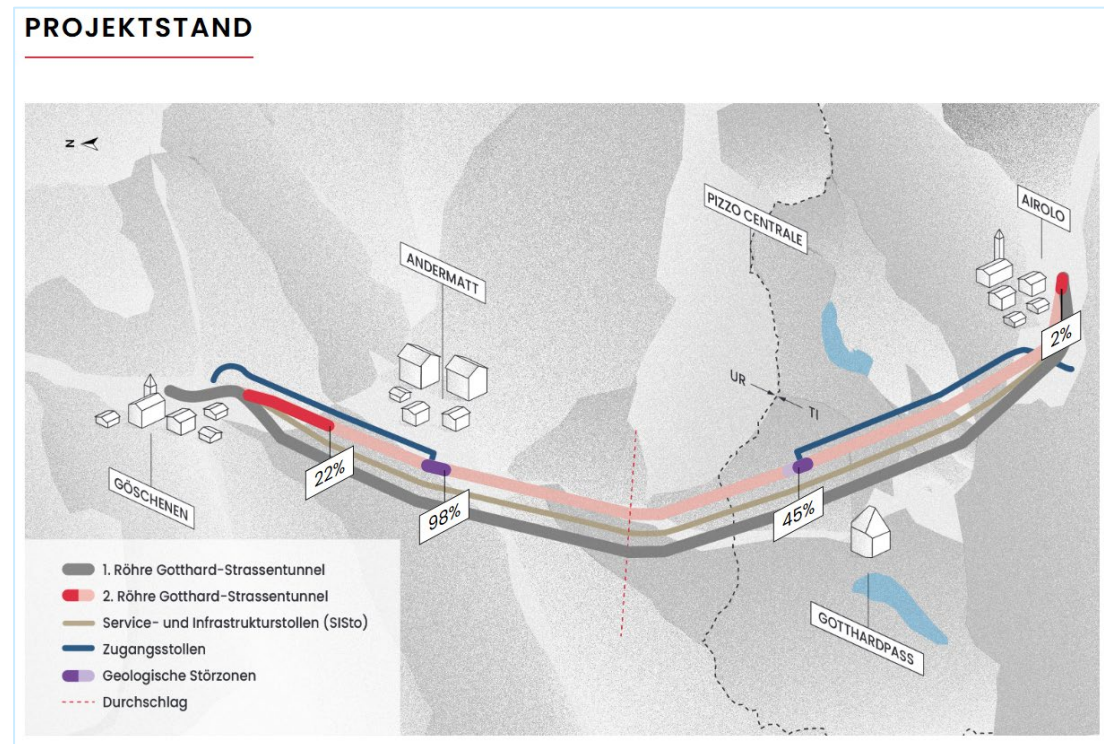

Projektstatusberichte

Projektstatusberichte (kurz Projektreports) sind das wichtigste Kommunikationsinstrument des Projekts gegen aussen.

- Empfänger (Bericht zielgruppenorientiert anpassen)
 - Auftraggeber
 - Steering Committee (STC) - Mitglieder
 - wichtige Stakeholder wie z.B. Kunden oder Nutzer


- Periode
 - Monatlich oder in intensiven Phasen wöchentlich

- Inhalt:

Der Projektstatusbericht soll über die wichtigsten Bereiche des Projekts Auskunft geben

- Fortschrittsmeldung
- erzielte Erfolge
- Kennzahlen
- ...

Quellen des Projektstatusberichts

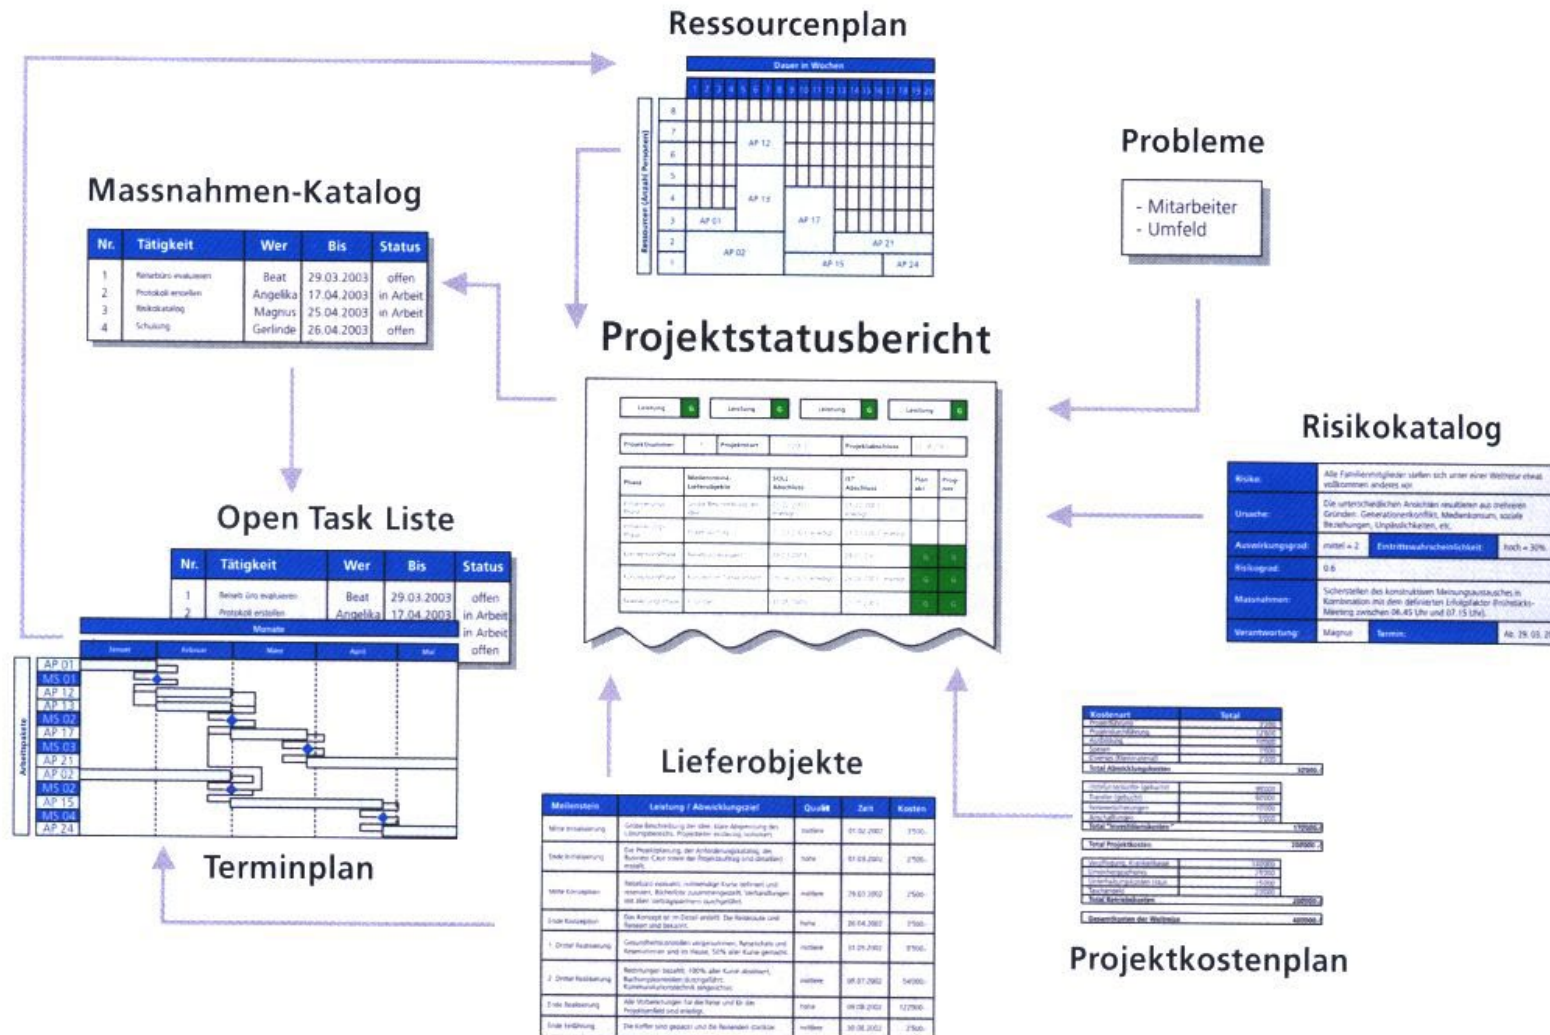

Quelle: Bruno Jenny: Projektmanagement – Das Wissen für eine erfolgreiche Karriere; vdf Verlag

Inhalte Projektstatusbericht

Mögliche Inhalte gemäss Bruno Jenny für die Zielgruppe «Projektsteuerungsausschuss»:

- Zeitpunkt der Fortschritts- und Aufwandsmeldung
- Vergleich von Soll/Ist-Zustand des Projekts
- Erzielte Erfolge
- Beurteilung der Wirksamkeit früher eingeleiteter Steuerungsmassnahmen
- Drohende Risiken und/oder Probleme
- Gründe der Abweichung und Massnahmen
- Aufwandgemässer Stand des Projektes (Restaufwand)
- Personalsituation
- Hauptaktivitäten der nächsten Berichtsperiode


Aufgabe E – Struktur Projektstatusbericht

Welche Informationen sollen in einem Projektstatusbericht für den enthalten sein?

Entwerfen Sie ein Template für einen Projektstatusbericht in Word- oder PowerPoint.

1. Überlegen Sie sich in einem ersten Schritt die **Zielgruppe** und davon abgeleitet die Hauptstruktur (Kapitel) und **Inhalte** des Projektstatusberichts.
2. Entwerfen Sie dann das Template.
Beschreiben Sie die einzelnen Abschnitte mit einer kurzen Inhaltsangabe in Stichworten.

Zeit: 10 Minuten

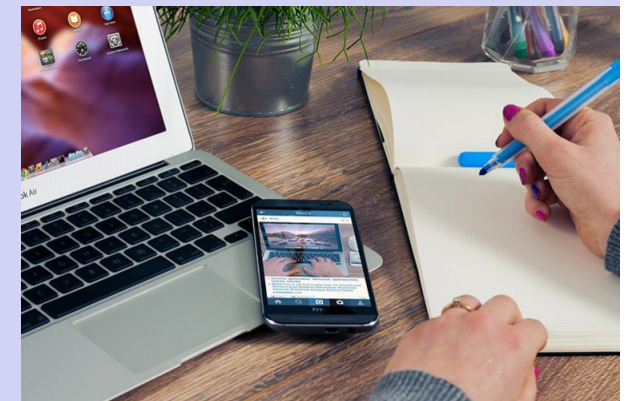

Lösung Aufgabe E

Struktur Projektstatusbericht für Zielgruppe «Steuerungsausschuss» (I)

1. Berichtsperiode, Datum und PL/Autor

2. Projekt Status

- Angaben zum Status einzelner Aspekte graphisch mit Ampeln:
 - grün alles i.O.
 - gelb -> kritische Situation
 - rot -> sehr kritisch mit Handlungsbedarf.
Resultate oder Lieferungszeitpunkt sind nicht zu halten.
- Die Aspekte sind: Overall, Kosten, Zeit, Ressourcen, Focus und Interfaces
- Managementinformationen:
Kurze prägnante Informationen für das Management.
Zu jeder gelben oder roten Ampel muss eine Info stehen. Bei roten Ampeln die getroffene Massnahme.
- Optional aber empfohlen sind wichtige **Erfolgsmeldungen** über erreichte Resultate oder Zwischenziele.

Struktur Projektstatusbericht für Zielgruppe «Steuerungsausschuss» (II)

3. Status Kosten

- Kurze und übersichtliche Darstellung der Projektaufwände.
- Aufgelaufene Kosten unterteilt nach internen MA, externe MA und Software
- Projektbudget und Differenz Aufwand/Budget
- Prognose der Kosten für die Folgemonate bis Ende Jahr

Struktur Projektstatusbericht für Zielgruppe «Steuerungsausschuss» (III)

4. Status der Projektresultate

4.1 Resultat Status:

- Übersichtliche aber relativ detaillierte Beschreibung der Erreichung der einzelnen Projektresultate.

Hier werden alle Projektresultate (Haupt- und Teilresultate) mit der Erarbeitungsstatus in % aufgeführt.

Die Aspekte sind: Resultatname, Fälligkeit, Fortschritt in %, Status mit Ampel, Ausblick und Kommentar

4.1 Nächste Schritte

- Ausblick auf die abzuliefernden Projektresultate und/oder die wichtigen Aktivitäten für die nächsten 3 Monate


5. Risiken

- Kurze und übersichtlichen Darstellung der wichtigsten Projektrisiken (maximal 4-8), deren Status und getroffenen Massnahmen

Projektstatusbericht für Zielgruppe «Steuerungsausschuss»: Beispiele

Die Beispiele finden Sie im Unterordner «Projektstatusreport».

- [DiMA-Programm – Projektstatusreport](#)
- [Projektreport Template 1](#)
- [Projektreport Template 2](#)
- [InnoSuisse Meilensteinbericht](#)

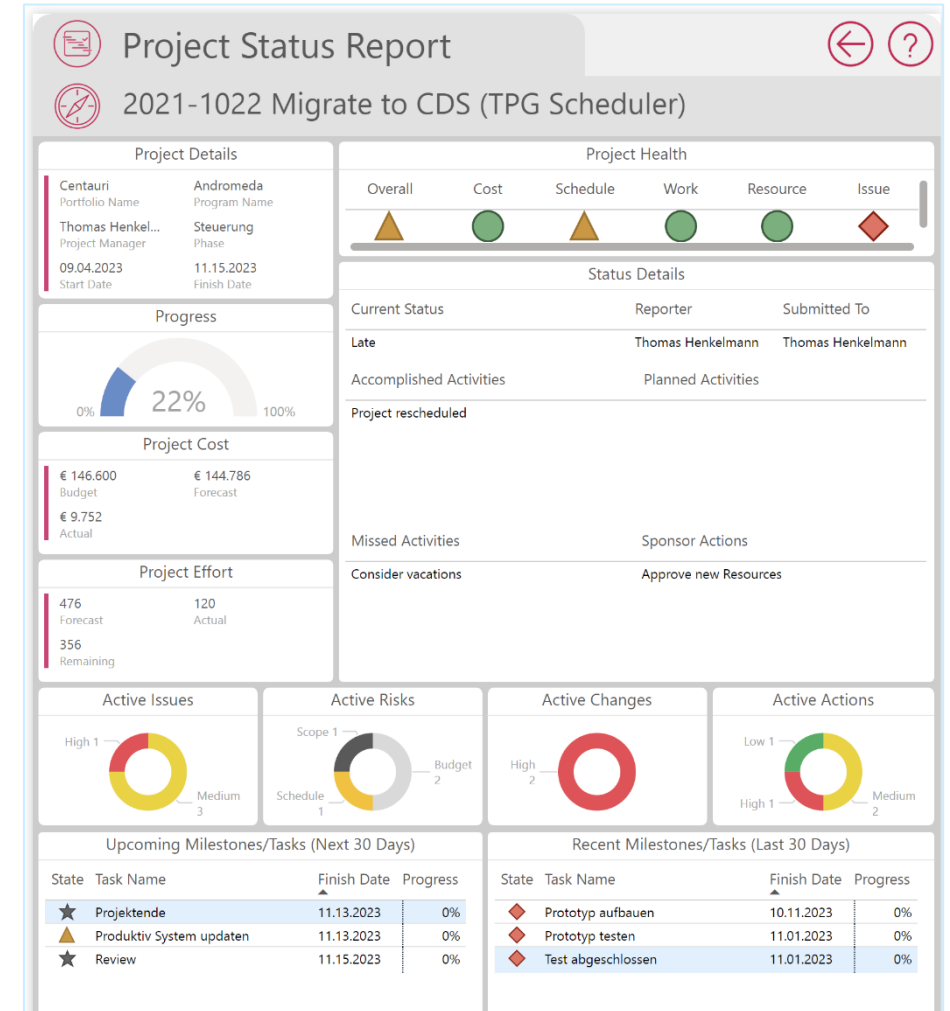

Fragen?

Hochschule Luzern
Informatik
Forschung
Prof. Peter Sollberger
Dozent

T direkt +41 41 757 68 46
peter.sollberger@hslu.ch
